Planning prévisionnel des Travaux

Durée des travaux : du 10 septembre 2018 au 30 juin 2019 .

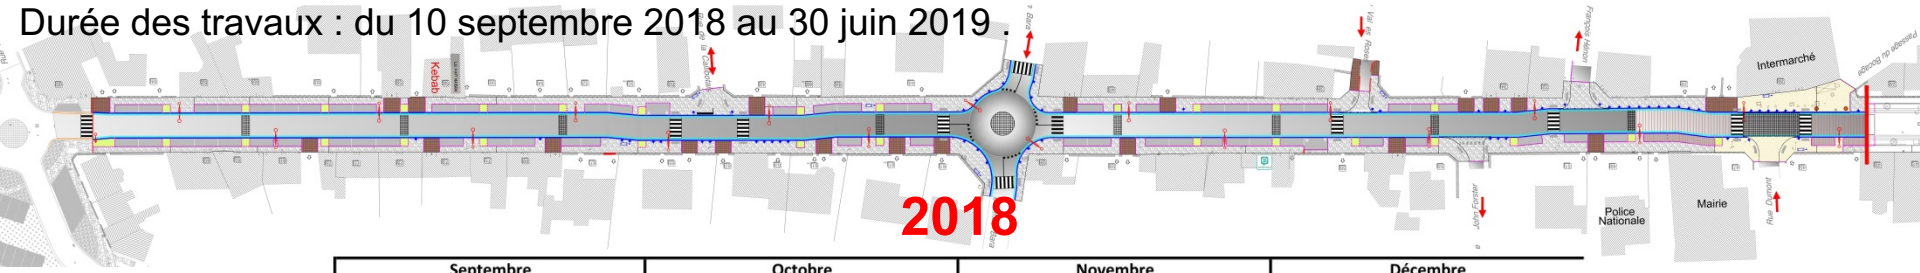

Septembre							Octobre							Novembre							Décembre						
	Prépa 3 S	ASS 11 S	AEP 10 S	Eff Réseaux 17 S	Amgt Voirie 21 S	Ecl Public 8 S		Prépa 3 S	ASS 11 S	AEP 10 S	Eff Réseaux 17 S	Amgt Voirie 21 S	Ecl Public 8 S		Prépa 3 S	ASS 11 S	AEP 10 S	Eff Réseaux 17 S	Amgt Voirie 21 S	Ecl Public 8 S		Prépa 3 S	ASS 11 S	AEP 10 S	Eff Réseaux 17 S	Amgt Voirie 21 S	Ecl Public 8 S
1 S							1 L							1 J							1 S						
2 D							2 M							2 V							2 D						
3 L							3 M							3 S							3 L						
4 M							4 J							4 D							4 M						
5 M							5 V							5 L							5 M						
6 J							6 S							6 M							6 J						
7 V							7 D							7 M							7 V						
8 S							8 L							8 J							8 S						
9 D							9 M							9 V							9 D						
10 L							10 M							10 S							10 L						
11 M							11 J							11 D							11 M						
12 M							12 V							12 L							12 M						
13 J							13 S							13 M							13 J						
14 V							24 D							14 M							14 V						
15 S							15 L							15 J							15 S						
16 D							16 M							16 V							16 D						
17 L							17 M							17 S							17 L						
18 M							18 J							18 D							18 M						
19 M							19 V							19 L							19 M						
20 J							20 S							20 M							20 J						
21 V							21 D							21 M							21 V						
22 S							22 L							22 J							22 S						
23 D							23 M							23 V							23 D						
24 L							24 M							24 S							24 L						
25 M							25 J							25 D							25 M						
26 M							26 V							26 L							26 M						
27 J							27 S							27 M							27 J						
28 V							28 D							28 M							28 V						
29 S							29 L							29 J							29 S						
30 D							30 M							30 V							30 D						
							31 M														31 L						

Pose et remise en circulation du Boulevard pendant les vacances de Noël

Préparation du chantier : Abbatage Arbres, Dessouchage, Démontage Mobilier, Mise en place des déviations.
Assainissement : Création d'un réseau séparatif des eaux usées et pluviales
Eau Potable : Réhabilitation des branchements plomb
Effacement des réseaux aériens : Dépose et enfouissement de l'ensemble des réseaux aériens (électricité, télécom et éclairage public)
Aménagement surfacique : Pose des bordures, créations des trottoirs et des entrées charretières, mise en œuvre de la chaussée, pose du mobilier urbain
Eclairage Public : Câblage et pose des candélabres
Espaces verts (Automne 2019) : Plantations des arbres.

Vacances scolaires

VILLE DE Dinard

Boulevard Féart - Réunion Publique du 19 juin 2018

Planification des travaux

Ville de Dinard

2019



Pose et remise en circulation du Boulevard pendant les vacances de Noël

Janvier							Février							Mars							Avril							Mai							Juin						
	Prépa 3 S	ASS 11 S	AEP 10 S	Eff Réseaux 17 S	Amgt Voirie 21 S	Ecl Public 8 S		Prépa 3 S	ASS 11 S	AEP 10 S	Eff Réseaux 17 S	Amgt Voirie 21 S	Ecl Public 8 S		Prépa 3 S	ASS 11 S	AEP 10 S	Eff Réseaux 17 S	Amgt Voirie 21 S	Ecl Public 8 S		Prépa 3 S	ASS 11 S	AEP 10 S	Eff Réseaux 17 S	Amgt Voirie 21 S	Ecl Public 8 S		Prépa 3 S	ASS 11 S	AEP 10 S	Eff Réseaux 17 S	Amgt Voirie 21 S	Ecl Public 8 S		Prépa 3 S	ASS 11 S	AEP 10 S	Eff Réseaux 17 S	Amgt Voirie 21 S	Ecl Public 8 S
1 M							1 V							1 V							1 L							1 M							1 S						
2 M							2 S							2 S							2 M							2 J							2 D						
3 J							3 D							3 D							3 M							3 V							3 L						
4 V							4 L							4 L							4 J							4 S							4 M						
5 S							5 M							5 M							5 V							5 D							5 M						
6 D							6 M							6 M							6 S							6 L							6 J						
7 L							7 J							7 J							7 D							7 M							7 V						
8 M							8 V							8 V							8 L							8 M							8 S						
9 M							9 S							9 S							9 M							9 J							9 D						
10 J							10 D							10 D							10 M							10 V							10 L						
11 V							11 L							11 L							11 J							11 S							11 M						
12 S							12 M							12 M							12 V							12 D							12 M						
13 D							13 M							13 M							13 S							13 L							13 J						
14 L							24 J							24 J							14 D							14 M							14 V						
15 M							15 V							15 V							15 L							15 M							15 S						
16 M							16 S							16 S							16 M							16 J							16 D						
17 J							17 D							17 D							17 M							17 V							17 L						
18 V							18 L							18 L							18 J							18 S							18 M						
19 S							19 M							19 M							19 V							19 D							19 M						
20 D							20 M							20 M							20 S							20 L							20 J						
21 L							21 J							21 J							21 D							21 M							21 V						
22 M							22 V							22 V							22 L							22 M							22 S						
23 M							23 S							23 S							23 M							23 J							23 D						
24 J							24 D							24 D							24 M							24 V							24 L						
25 V							25 L							25 L							25 J							25 S							25 M						
26 S							26 M							26 M							26 V							26 D							26 M						
27 D							27 M							27 M							27 S							27 L							27 J						
28 L							28 J							28 J							28 D							28 M							28 V						
29 M														29 V							29 L							29 M							29 S						
30 M														30 S							30 M							30 J							30 D						
31 J														31 D															31 V							31 L						

Préparation du chantier : Abbatage Arbres, Dessouchage, Démontage Mobilier, Mise en place des déviations.
Assainissement : Création d'un réseau séparatif des eaux usées et pluviales
Eau Potable : Réhabilitation des branchements plomb
Effacement des réseaux aériens : Dépose et enfouissement de l'ensemble des réseaux aériens (électricité, télécom et éclairage public)
Aménagement surfacique : Pose des bordures, créations des trottoirs et des entrées charretières, mise en œuvre de la chaussée, pose du mobilier urbain
Eclairage Public : Câblage et pose des candélabres
Espaces verts (Automne 2019) : Plantations des arbres.

Vacances scolaires
